Резюме

[ДОПУЩЕНИЕ] Концепция сервиса • [РАСЧЕТ] Финансы базового сценария

АгроВектор

Мониторинг посевов и точечное внесение
с проверяемым заданием и отчетом

Одна бригада • Татарстан — условная зона

Гражданская переподготовка специалистов БПЛА

9,5

млн ₽

Стартовая потребность

3,95

млн ₽ NPV

Ставка 24%; горизонт 5 лет

Решение: поэтапное финансирование после правовой проверки и подтверждения спроса

SMART-цели

[ДОПУЩЕНИЕ]

Цель / результат	Срок	Подтверждение
Правовая карта всех полей; GO/NO-GO	01.11.2026	Директор; заключение юриста
20 интервью; заявки: 6 000 / 4 000	29.11.2026	Директор; реестр заявок
10 клиентов; договоры: 6 000 / 4 000	21.03.2027	Директор; договоры и календарь
3 аппарата; 2 оператора; пилот 100 га	30.04.2027	Опер. руководитель; акты и допуски
6 000 / 4 000; выручка 8,8 млн ₽	12.09.2027	Директор; акты и учет
2 оператора: обучение и наставник	11.04.2027; контроль 12.07.2027	Опер. руководитель; протоколы

Объемы: га-проходы внесения / га-обследования. Это разные операции, не сумма площади.

Коммерческие цели не отменяют право остановить небезопасное задание

Описание продукта и стратегическая канва

[ДОПУЩЕНИЕ] Стратегическая канва предложения; сравнение компаний — только на слайде 6

Один договор

Задание → обследование → внесение → отчет. Мониторинг оплачивается отдельно.

Локальный маршрут

Татарстан до 150 км; от 100 га-проходов. Только при подтвержденном допуске.

Проверяемый результат

Объем, параметры и отклонения; отчет до 48 часов — цель, не доказанное преимущество.

Не обещаем универсальную экономию препаратов или гарантированный рост урожайности

Business Model Canvas

[ДОПУЩЕНИЕ]

1 / Сегменты

КФХ, малые и средние; агрохолдинги — вторично

2 / Ценность

Обследование, карта задания, внесение и отчет

3 / Каналы

Директор; агрономы; демонстрации; рекомендации

4 / Отношения

Один контакт; календарь сезона; разбор отклонений

5 / Доходы

₽/га-проход и ₽/га-обследование; отдельно

6 / Ресурсы

Одна бригада; 3 БВС; резерв ликвидности

7 / Действия

Правовая проверка; выполнение; контроль; сервис

8 / Партнеры

Агроном; обучение; сервис; юрист; бухгалтер

9 / Затраты

Труд; эксплуатация; услуги; CAPEX отдельно

Маркетинговый план

[РАСЧЕТ] на [ДОПУЩЕНИЕ]: TAM / SAM / SOM — сценарные, не внешняя статистика

1,245 млрд

TAM / ₽ в год

2 000 хозяйств × 2 000 га
15% пригодной площади

124,5 млн

SAM / ₽ в год

200 хозяйств × 2 000 га
Условный доступный кластер

8,8 млн

SOM / первый сезон

6 000 га-проходов × 1 300 ₽
+ 4 000 обследований × 250 ₽

TAM = 2 000 × 2 000 × 15% × (1,5 × 1 300 + 0,5 × 250); SAM — для 200 хозяйств.

SOM / SAM: 7,07% выручки; 6,67% внесения; 13,33% мониторинга.
2 000 / 200 хозяйств — гипотезы, не реестр. Микс SOM отличается от SAM.

Источники: https://www.vesti.ru/article/4893778 · https://www.rshb.ru/news/16072026-000004

Анализ конкурентов

Проверка 20.10.2026: [ФАКТ] заявления компаний; АгроВектор — [ДОПУЩЕНИЕ]

Исполнитель	Услуги / территория	Цена и база, руб./га	Доказательства / ограничения
BeeUAV	Внесение; Татарстан упомянут	Не раскрыта; НДС н/д	Объем и доля не раскрыты [2]
Агропрофи	Внесение и посев; Поволжье	Не раскрыта; НДС н/д	50 тыс.+ га без периода; доля н/д [3][4]
Аграс	Аренда и сервис; Татарстан заявлен	Не раскрыта; НДС услуги н/д	Проекты РТ >40 тыс. га за 2025; доля н/д [5]
Гермес	Внесение и мониторинг; Краснодар/Адыгея	Не раскрыта; НДС н/д	Кейс 500 га без даты; доля н/д [6]
Агродроны ЮФО	Внесение; юг РФ; не Татарстан	900 средняя; НДС и логистика н/д	Акты заявлены; объем и доля н/д [7]
АгроВектор (план)	Внесение и мониторинг; Татарстан условно	1300 / 250 план; без НДС и препаратов	Нет выполненного сезона и установленной доли

Доли публично не раскрыты. 900 ₽ — не сопоставимое КП Татарстана. Н/д ≠ 0.

Развернутый SWOT

[ДОПУЩЕНИЕ]

S / Конструкция сервиса

Мониторинг + задание + отчет
Резервный аппарат
→ Единая приемка и готовность резерва

W / Ограничения

Нет подтвержденного портфеля
Одна бригада; экономный ФОТ
→ Заявки до закупки, лимит нагрузки

O / Возможности

Локальные задачи хозяйств
Гражданская переподготовка
→ Платный пилот и наставничество

T / Угрозы

Запреты; погода; ценовое давление
Просрочка платежей
→ No-go, резерв времени и аванс

Стратегия WT: не расширять парк до подтверждения правовой доступности, кадров и экономики

Пять сил Портера

[ДОПУЩЕНИЕ]

Сила	Уровень гипотезы	Ответ проекта / что проверить
Соперничество	Высокий	Приемка и сроки; сопоставимые КП
Новые участники	Средний	Повторные договоры; стоимость готовности
Заменители	Высокий	Отбор задач; полная стоимость альтернатив
Покупатели	Высокий	Лимит концентрации; причины отказов
Поставщики	Средний–высокий	Запчасти, резерв, сервис; реальные сроки ремонта

Устойчивое конкурентное преимущество до полевой проверки не подтверждено

Организационно-правовая форма и регуляторный контур

[ДОПУЩЕНИЕ] ООО и порядок проверки; не юридическое заключение

ООО

Договорный контур и долевое финансирование.

Статус БВС определяется по максимальной взлетной массе, не по массе пустого аппарата.

Отдельный gate	Что подтвердить до работы
БВС	Учет / регистрация и применимые документы
Полет	Территория, маршрут и условия использования
АХР	Правомерность конкретной схемы выполнения
Препарат	Допустимость технологии и регламент применения
Регион	Действующий запрет / исключения, если применимы

ФАП-303 прочитан во вторичном тексте; режим Татарстана и санитарные условия требуют сверки

Источники: https://base.garant.ru/414829385/ · http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1600202211300002

Стейкхолдеры: власть и интерес

[ДОПУЩЕНИЕ]

Высокая власть / высокий интерес

Учредитель, инвестор, клиенты и агрономы
→ План-факт; договоры; приемка
Владелец: директор

Высокая власть / переменный интерес

Уполномоченные органы
→ Документы по конкретной территории
Владелец: внешний юрист

Средняя власть / высокий интерес

Операторы, учебный партнер, агроном
→ Инструктаж, нагрузка, компетенции
Владелец: операционный руководитель

Низкая власть / высокий или переменный

Кандидаты после СВО, соседи полей
→ Добровольность; канал обращений
Владелец: директор

Сервис техники: средняя власть / средний интерес; регламент реакции — операционный руководитель.

Производственный план

[ДОПУЩЕНИЕ] Производительность • [РАСЧЕТ] Календарная емкость бригады

13 000

га-проходов / потолок

100 эффективных дней × 130 га

Основной + резервный аппарат

Резерв не удваивает мощность

10 000

га-обследований

20 отдельных дней × 500 га

Без одновременных полетов

Одной бригадой — по очереди

34

дня резерва

154 календарных дня сезона

− 100 дней внесения

− 20 дней мониторинга

Проверка → обследование → подготовка → выполнение → контроль и акт

Июнь 2031: 30 полевых дней из 30. Поздняя база ресурсно не подтверждена

Организационный план

[ДОПУЩЕНИЕ]

3 FTE

3,0 млн ₽ / год — бюджет штатного труда; требует проверки рынка и начислений

Штатная роль	Функции
Директор	Продажи, договоры, деньги и партнеры
Оператор / операционный руководитель	Календарь, техника, безопасность и наставник
Второй оператор / помощник	Подготовка; мониторинг в отдельных окнах

Вне штата: агроном, юрист, бухгалтер и учебный партнер — оплачиваемые услуги.

После СВО: добровольный отбор → гражданское обучение → наставник → проверка компетенций

Одинаковые требования для всех; опыт не дает автоматического допуска. Личные данные — конфиденциально.

WBS / иерархическая структура работ

[ДОПУЩЕНИЕ] WBS из data/project_plan.csv; каждый пакет имеет результат

1 / Проверка модели

1.1 A — правовая карта
1.2 B — интервью и заявки
1.3 C — ООО и договоры

2 / Ресурсы

2.1 D — инвестиционное решение
2.2 E — приемка техники
2.3 F — обучение

3 / Предсезонная готовность

3.1 H — SOP, CRM, карты
3.2 I — приемочные испытания
3.3 J — договоры сезона


4 / Исполнение и контроль

4.1 K — коммерческий сезон
4.2 L — аудит и решение

Закупка ≠ разрешение на работы. Полевой пилот 100 га включен в апрельский сезон, не прибавлен сверху.

Диаграмма Ганта


[РАСЧЕТ] Гант из CSV • [ДОПУЩЕНИЕ] Даты и длительности — план, не выданные разрешения

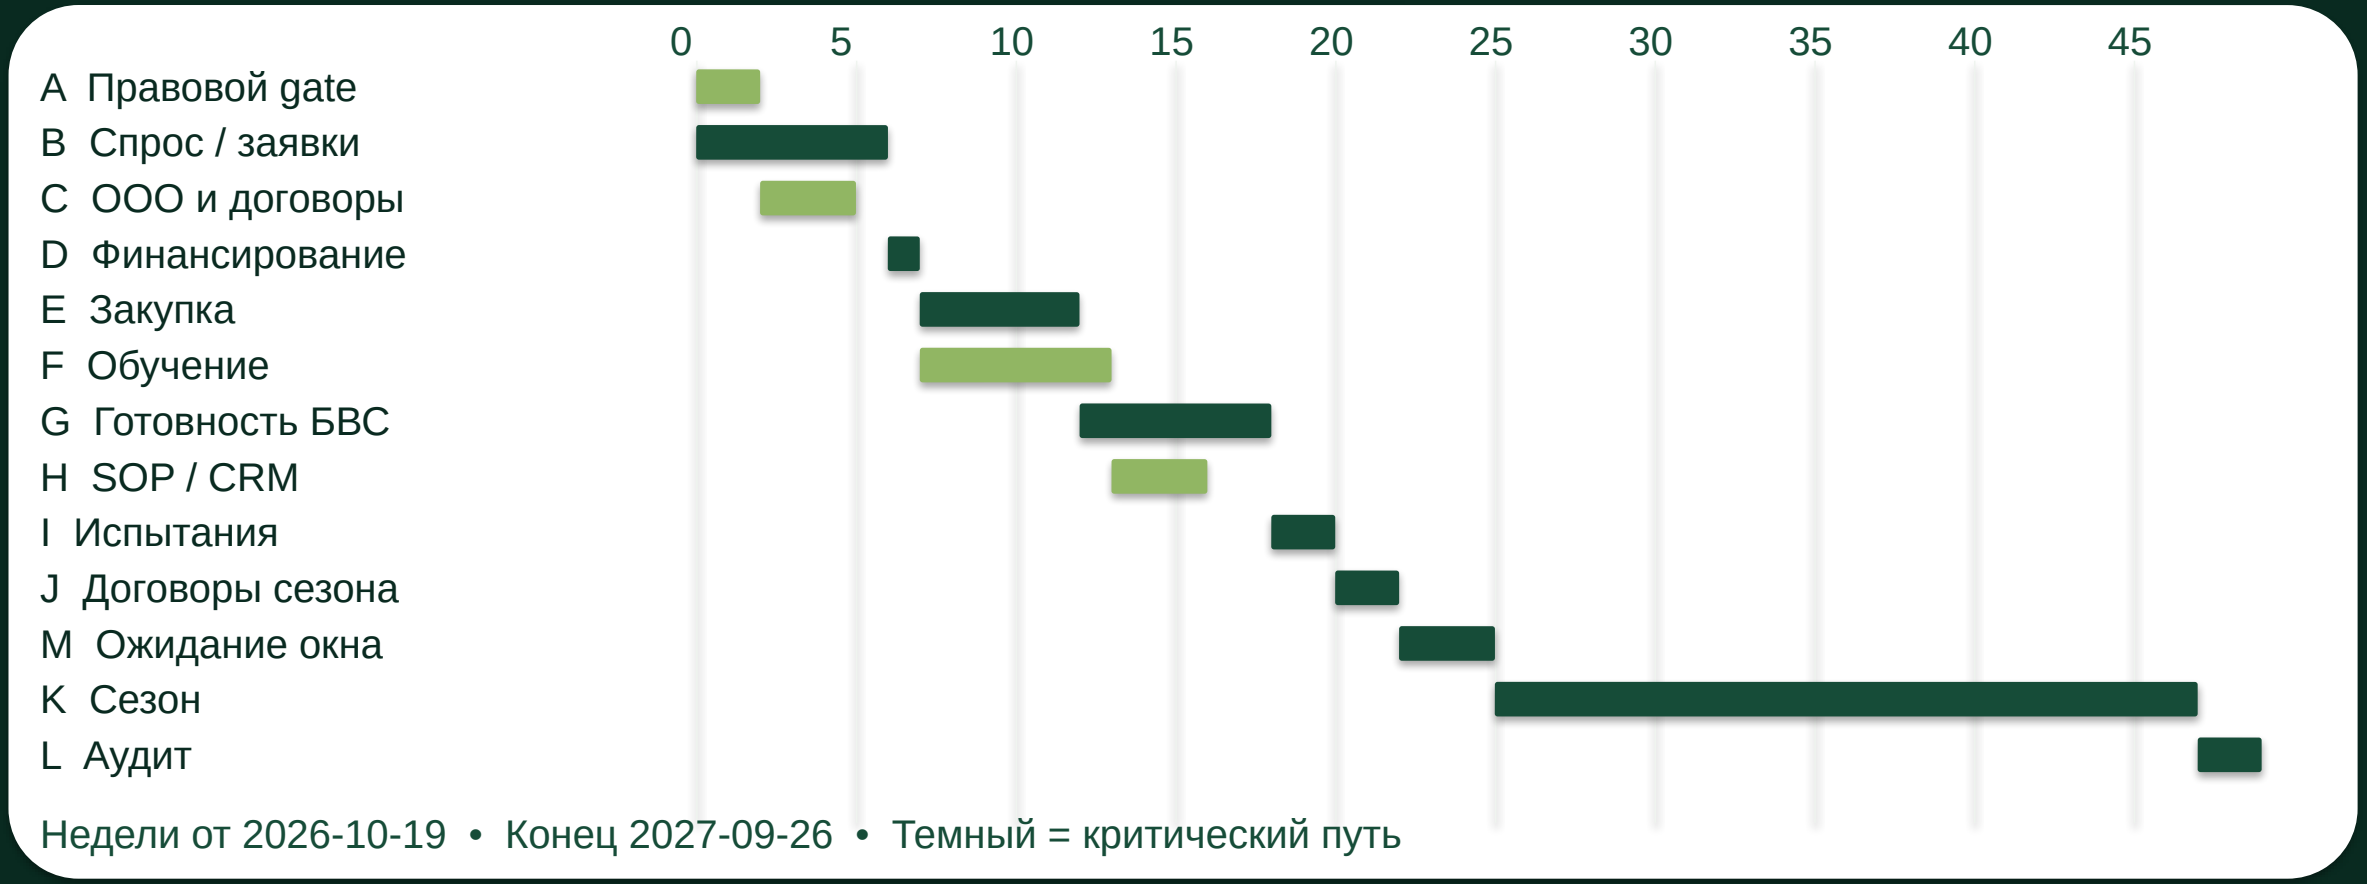

Сезон K: 2027-04-12 — 2027-09-12; пакет M: 3 недель ожидания окна.

Сетевой график

[РАСЧЕТ] Сеть finish-to-start из CSV; длительности — календарные недели

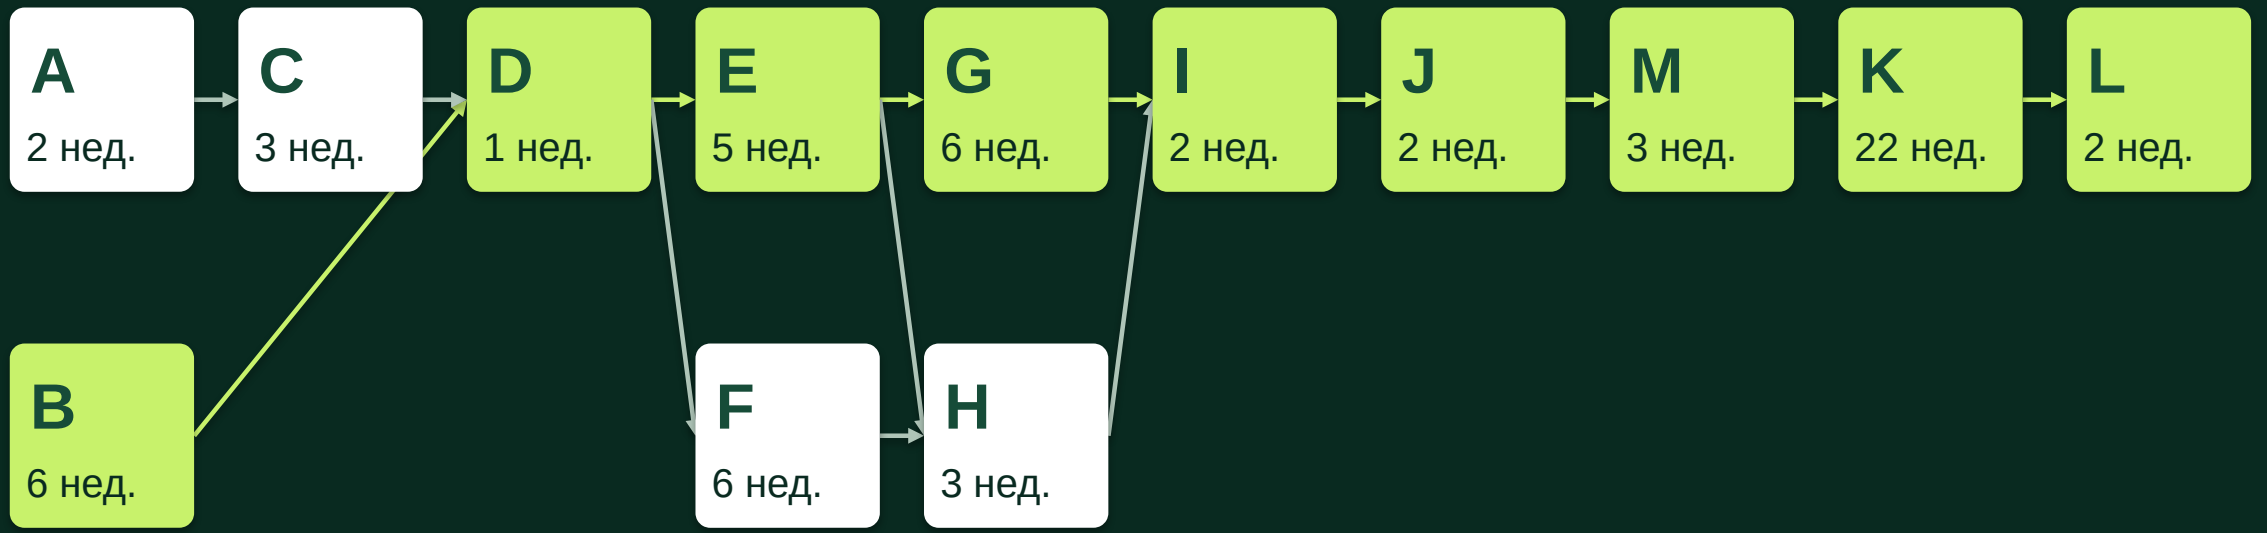

Критический путь: B → D → E → G → I → J → M → K → L

49 недель от проверки до аудита; M — явная работа ожидания, не свободный резерв

Матрица ответственности RACI


[ДОПУЩЕНИЕ] R — выполняет; A — принимает; C — консультирует; I — информируется

Работа	R	A	C	I
A Правовой gate	Юрист	Директор	Агроном, Опер. рук.	Инвестор
B Спрос / заявки	Продажи	Директор	Агроном	Инвестор
C ООО и договоры	Юрист	Директор	Бухгалтер	Инвестор
D Финансирование	Директор	Инвестор	Бухгалтер, Юрист	Команда
E Закупка	Опер. рук.	Директор	Агроном	Бухгалтер
F Обучение	Опер. рук.	Директор	Учеб. партнер, Агроном	Инвестор
G Готовность БВС	Юрист	Директор	Опер. рук.	Клиенты
H SOP / CRM	Агроном	Опер. рук.	Юрист	Продажи
I Испытания	Оператор	Опер. рук.	Агроном, Клиент	Директор
J Договоры сезона	Продажи	Директор	Агроном, Клиент	Бухгалтер
M Ожидание окна	Опер. рук.	Директор	Агроном, Клиент	Инвестор
K Сезон	Оператор	Опер. рук.	Агроном, Клиент	Директор
L Аудит	Бухгалтер	Директор	Агроном, Опер. рук.	Инвестор

Все 13 задач; один A в каждой строке. Продажи = директор; опер. рук. = один из двух операторов.

Финансовая модель

[РАСЧЕТ] Базовый сценарий; млн ₽, выручка без НДС. Входные данные — допущения

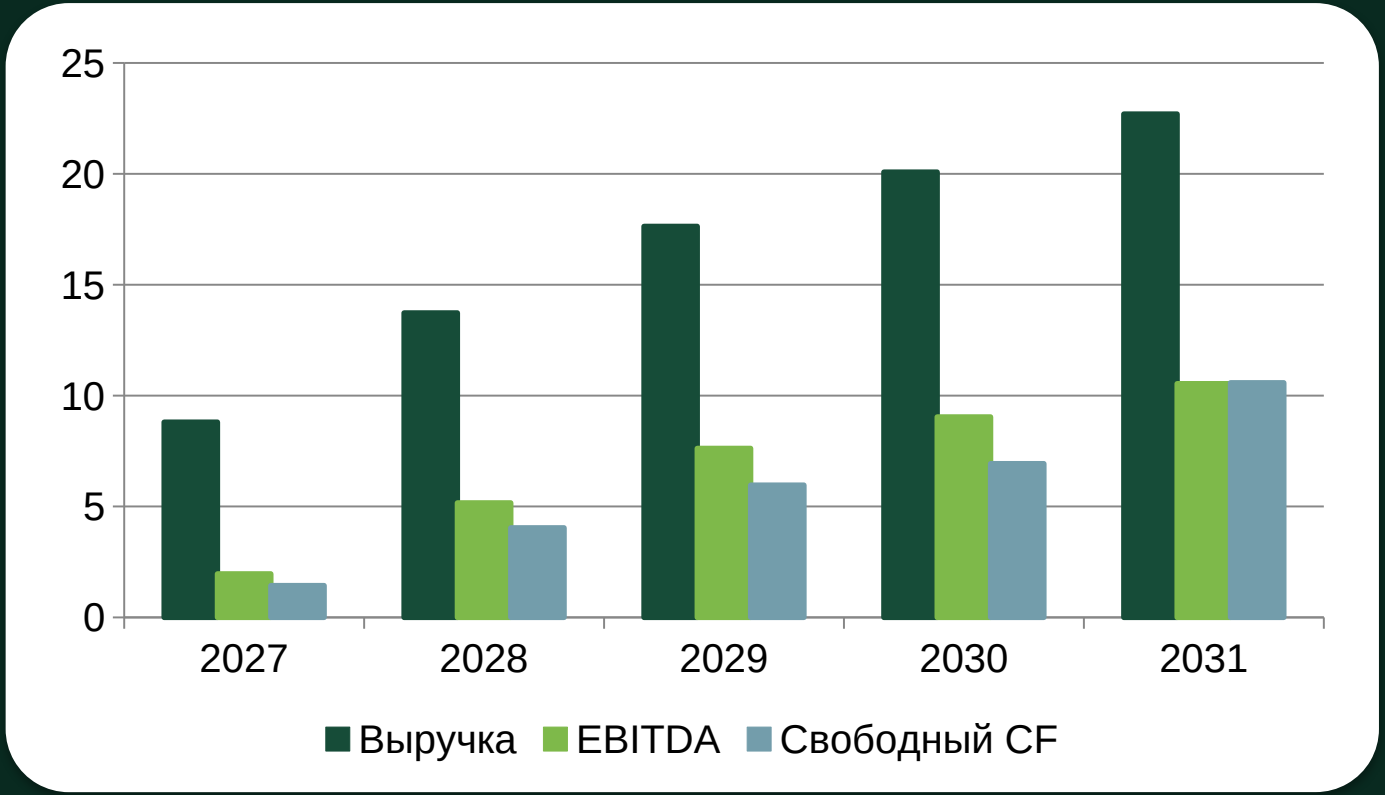

Год	Выручка	EBITDA	CF
2027	8,80	1,96	1,43
2028	13,73	5,16	4,04
2029	17,63	7,62	5,96
2030	20,08	9,04	6,93
2031	22,70	10,54	10,58


CF_0 = −9,50 млн ₽

CF 2031 включает возврат резерва 2,00 млн ₽.

Продажа оборудования в терминале = 0. Балансовая стоимость не превращена в денежный поток

NPV и окупаемость

[РАСЧЕТ] NPV на 5 лет; ставка дисконтирования 24%; млн ₽

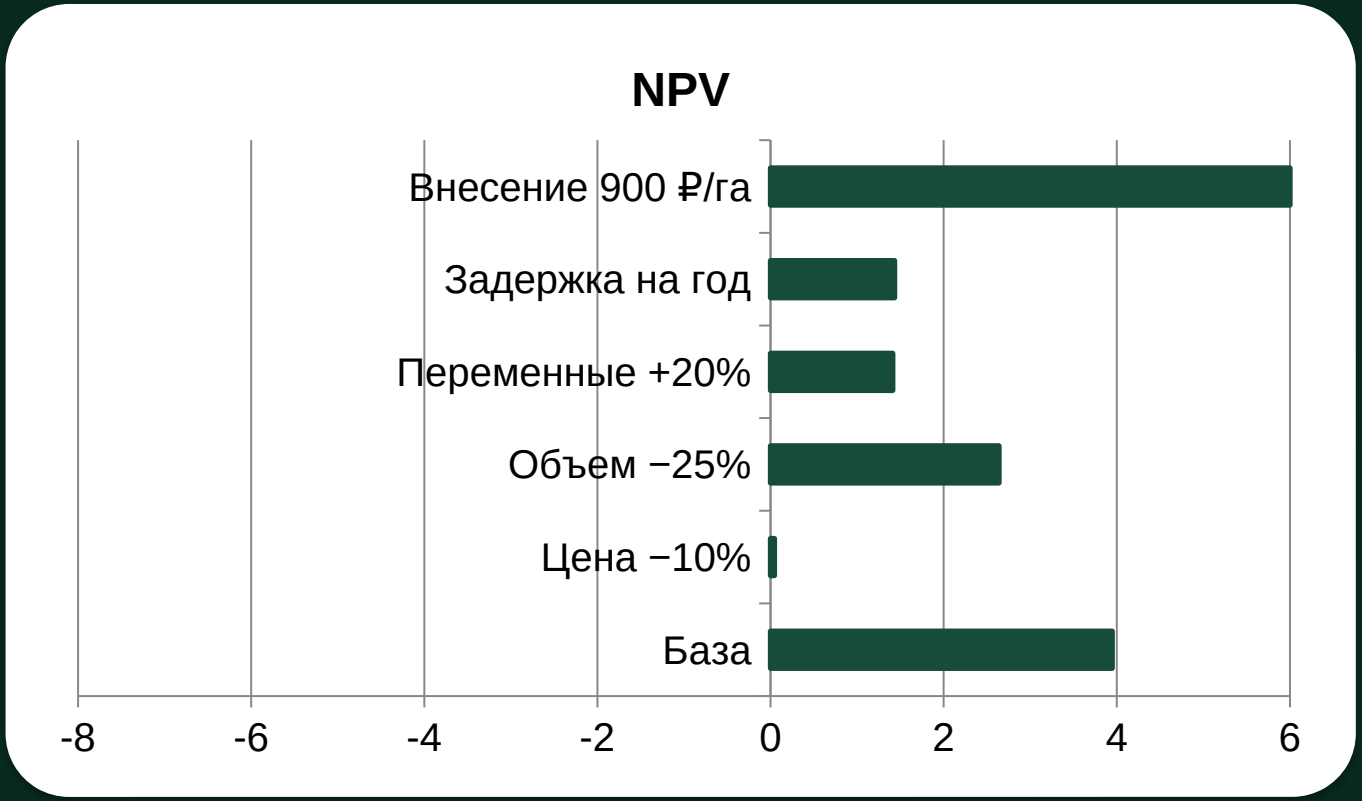

Сценарий	NPV, млн ₽
База	3,946
Цена −10%	0,045
Объем −25%	-2,639
Переменные +20%	1,412
Задержка на год	-1,433
Внесение 900 ₽/га	-6,605

Окупаемость базы: 2,68 года

Дисконтированная: 3,88 года

Комбинированный стресс: NPV -7,55 млн ₽; цена −10%, объем −25%, CAPEX +1,98 млн

Потребность в инвестициях

[ДОПУЩЕНИЕ] Бюджет до коммерческих предложений • [РАСЧЕТ] Сумма потребности

CAPEX	млн ₽
2 агродрона с АКБ / зарядкой	4,0
Транспорт / прицеп	1,4
Мониторинговый БВС	0,6
Подготовка состава / безопасность	0,4
ИТ	0,2
Капитальные запчасти	0,4

7,0 CAPEX

0,5 Стартовые расходы

2,0 Оборотный резерв

Пара XAG P100 Pro: ориентир 5,98 млн ₽ вместо лимита 4,0; финансирование 11,48 млн ₽.

Итого 9,5 млн ₽. Резерв — ликвидность, не повторный расход и не бюджет расширения

Структура источников инвестиций

[ДОПУЩЕНИЕ]

2,5

млн ₽ / учредитель

Подтвердить наличие денег
и оформить вклад

7,0

млн ₽ / внешний инвестор

Долевое финансирование
после проверки условий

База: 2,5 + 7,0 = 9,5 млн ₽; деньги не подтверждены.

Закупочный стресс: внешний вклад 8,98 млн ₽; нужно еще 1,98 млн ₽.

Долг и гранты исключены; доля инвестора определяется отдельно.

Это суммы источников, НЕ доли в капитале. Крупные закупки — только после инвестиционного gate

Основные технико-экономические показатели

[РАСЧЕТ] Финансовые KPI базы • [ДОПУЩЕНИЕ] Плановые операционные пороги

8,8 млн ₽

Выручка 2027

6000 га-проходов + 4000 обследований

22,3%

Маржа EBITDA 2027

До амортизации и налога УСН

1,432 млн ₽

Свободный CF 2027

После налога; до выплат инвесторам

13 000

Потолок га-проходов

100 дней × 130 га; подтвердить пилотом

10 клиентов

Портфель первого сезона

Договоры; календарь; актирование

0 работ

Без требуемой готовности

Учитывать также предотвращенные события

KPI подтверждаются актами, журналами, банковской выпиской и план-фактом — не презентацией.

Анализ рисков

[ДОПУЩЕНИЕ] Риск-рейтинг экспертный; инвестиционное решение условное

Риск / триггер	Ответ / владелец
Нет правового основания	NO-GO; директор + юрист
Погода / конфликт окон	Перепланирование; опер. руководитель
Заказы ниже плана / цена падает	Пересчет NPV; директор
Поломка / ошибка внесения	Резерв, SOP, остановка; опер. руководитель
Перегрузка / дефицит ликвидности	Лимит заказов, кассовый план; директор

INVESTMENT GATE

1. Письменная правовая карта
2. Заявки на доступные 6 000 га
3. Подтвержденные КП и кадры
4. Кассовый план и резерв
5. Приемка + апрельский пилот

Нет готовности → отложить капиталоемкий запуск. Мониторинг-only не доказан как прибыльная замена

Масштабирование — после фактического сезона, проверки претензий, загрузки и продлений.
