АгроВектор

Мониторинг посевов.

Точечное внесение. Проверяемый отчет.


Татарстан / План 2027–2031



9,5 млн ₽ — стартовая потребность

Заказы, разрешения и деньги не подтверждены.

Сначала доказательства — затем сезон



[ДОПУЩЕНИЕ] Правовая карта: 01.11.2026

20 интервью: 29.11.2026 · 10 клиентов: 21.03.2027

Пилот 100 га: до 30.04.2027, внутри сезонного объема.

Клиент покупает результат, не дрон

[ДОПУЩЕНИЕ] Задание → обследование → внесение → отчет

Отчет до 48 часов · маршрут от 100 га-проходов

Мониторинг оплачивается отдельно; урожайность не гарантируется.





Один договорный контур. Два потока доходов.

СЕГМЕНТЫ
КФХ, малые и средние хозяйства

ЦЕННОСТЬ
Задание → карта → внесение → отчет

КАНАЛЫ
Прямые продажи, агрономы

ОТНОШЕНИЯ
Планирование сезона, единый контакт

ДОХОДЫ
Внесение + отдельный мониторинг

РЕСУРСЫ
Одна бригада, три БВС

ДЕЙСТВИЯ
Продажи, допуски, работы, контроль

ПАРТНЕРЫ
Агроном, сервис, юрист — кандидаты

ЗАТРАТЫ
OPEX; CAPEX и резерв отдельно

Емкость — сценарий. Спрос предстоит подтвердить.

[РАСЧЕТ НА ДОПУЩЕНИЯХ] TAM 1 245 млн ₽ · SAM 124,5 млн ₽

SOM 8,8 млн ₽: 6 000 га-проходов + 4 000 га-обследований

SOM/SAM: 7,07% выручки — не фактическая доля.



Сравнивать нужно одно и то же задание

Исполнитель	Услуги / территория	Цена и база, руб./га	Доказательства / ограничения
BeeUAV	Внесение; Татарстан упомянут	Не раскрыта; НДС н/д	Объем и доля не раскрыты [2]
Агропрофи	Внесение и посев; Поволжье	Не раскрыта; НДС н/д	50 тыс.+ га без периода; доля н/д [3][4]
Аграс	Аренда и сервис; Татарстан заявлен	Не раскрыта; НДС услуги н/д	Проекты РТ >40 тыс. га за 2025; доля н/д [5]
Гермес	Внесение и мониторинг; Краснодар/Адыгея	Не раскрыта; НДС н/д	Кейс 500 га без даты; доля н/д [6]
Агродроны ЮФО	Внесение; юг РФ; не Татарстан	900 средняя; НДС и логистика н/д	Акты заявлены; объем и доля н/д [7]
АгроВектор (план)	Внесение и мониторинг; Татарстан условно	1300 / 250 план; без НДС и препаратов	Нет выполненного сезона и установленной доли

Заявления сайтов; доли не раскрыты. Цены регионов и комплекты несопоставимы. URL, даты и полная матрица — в заметках.



Резерв техники не заменяет подтвержденный спрос

[ДОПУЩЕНИЕ] S: связка задания и отчета; резервный борт

W: нет портфеля; одна бригада; экономный фонд труда

O: локальные задачи · T: ограничения и погодные окна.



Пять сил давят на цену и сезонное окно

Сила	Уровень гипотезы	Ответ проекта / что проверить
Соперничество	Высокий	Приемка и сроки; сопоставимые КП
Новые участники	Средний	Повторные договоры; стоимость готовности
Заменители	Высокий	Отбор задач; полная стоимость альтернатив
Покупатели	Высокий	Лимит концентрации; причины отказов
Поставщики	Средний–высокий	Запчасти, резерв, сервис; реальные сроки ремонта

Нет основания для работ — нет вылета

[ДОПУЩЕНИЕ] ООО; правовая проверка конкретного поля, БВС и операции

150 км — логистика, не разрешенная зона

Разрешения и участие в ЭПР не подтверждены.



Безопасность важнее формальной власти

[ДОПУЩЕНИЕ] Инвестор · клиент и агроном · органы · команда

Соседи и пчеловоды: уведомления и канал обращений

Угроза безопасности может остановить задание.



Одна бригада. Последовательные операции.

[ДОПУЩЕНИЕ] 2 оператора · основной, резервный и мониторинговый БВС

[РАСЧЕТ] 2027: 54,15 полевых дня

2031: 120 дней; июнь требует 30 из 30 — ресурс не подтвержден.

ПЛАНОВЫЕ ПОЛЕВЫЕ ДНИ; МОЩНОСТЬ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА





Компетенции подтверждаются, а не предполагаются

[ДОПУЩЕНИЕ] 3 FTE: директор и два оператора

Штат с начислениями: 3 000 000 ₽/год — требует проверки

Добровольная гражданская переподготовка; единые требования к допуску.



Каждая работа заканчивается проверяемым результатом


[ДОПУЩЕНИЕ] Проверка → ресурсы → готовность → сезон → аудит

13 пакетов: A–L и M

M: 3 недели готовности; полевой пилот — в K, не в зимних испытаниях.




Календарь запуска зависит от готовности

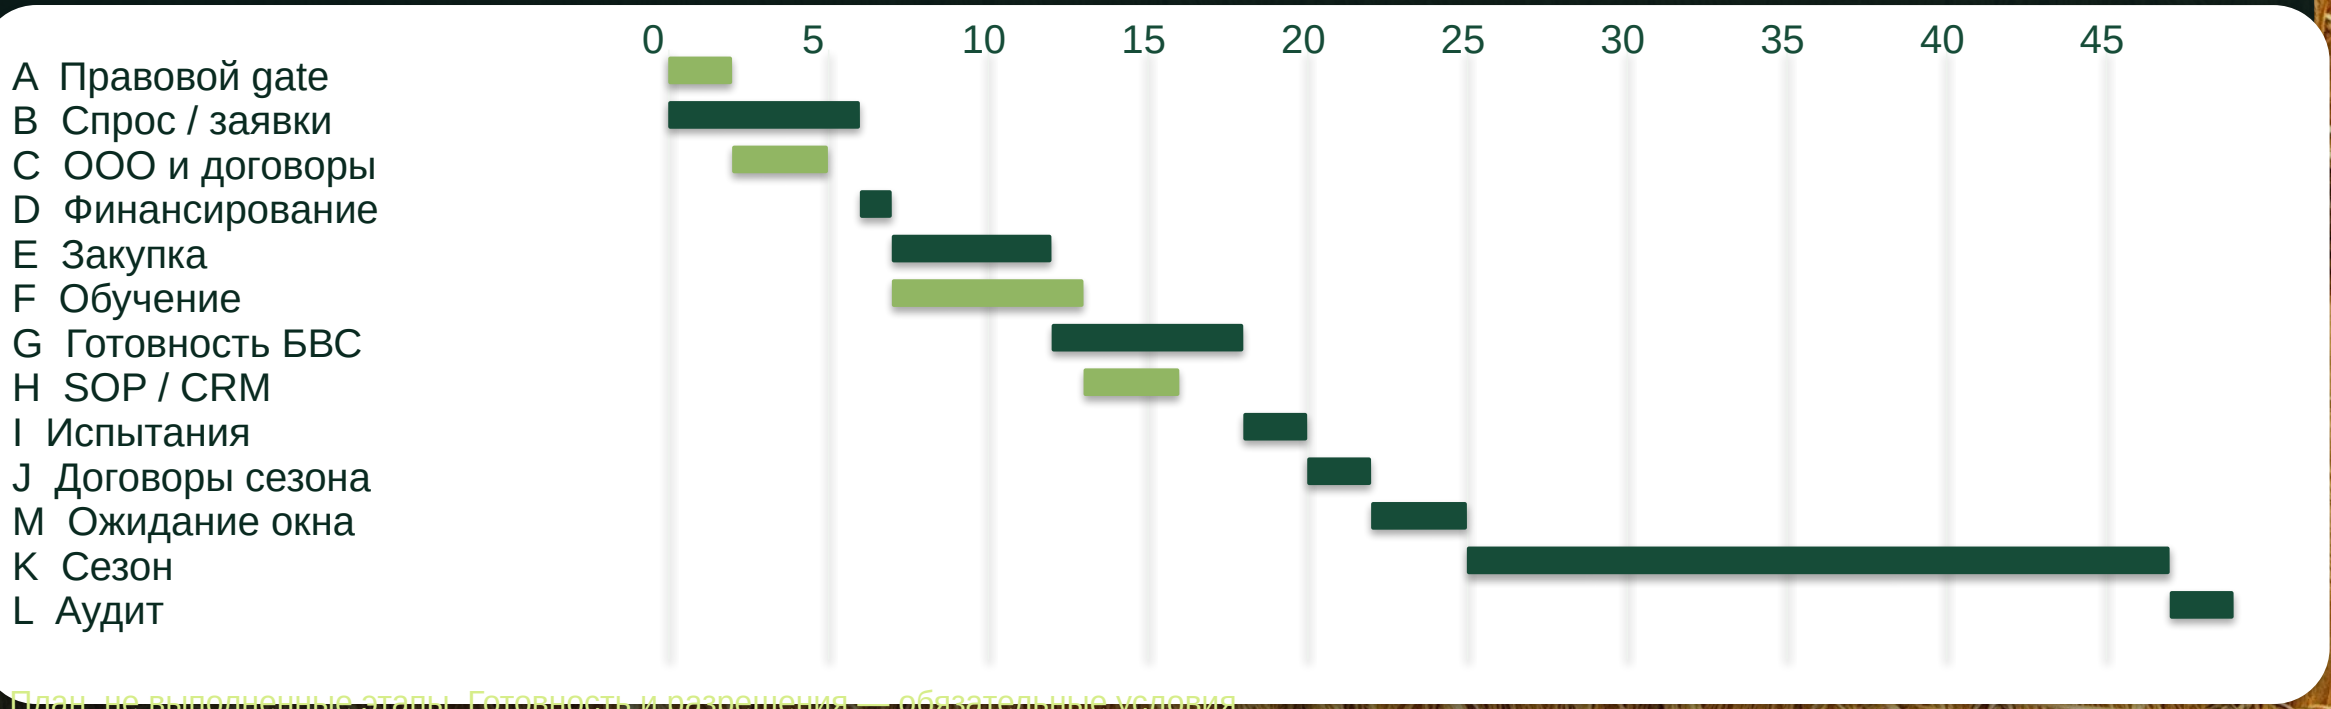

План, не выполненные этапы. Готовность и разрешения — обязательные условия.

Критический путь нельзя обойти закупкой

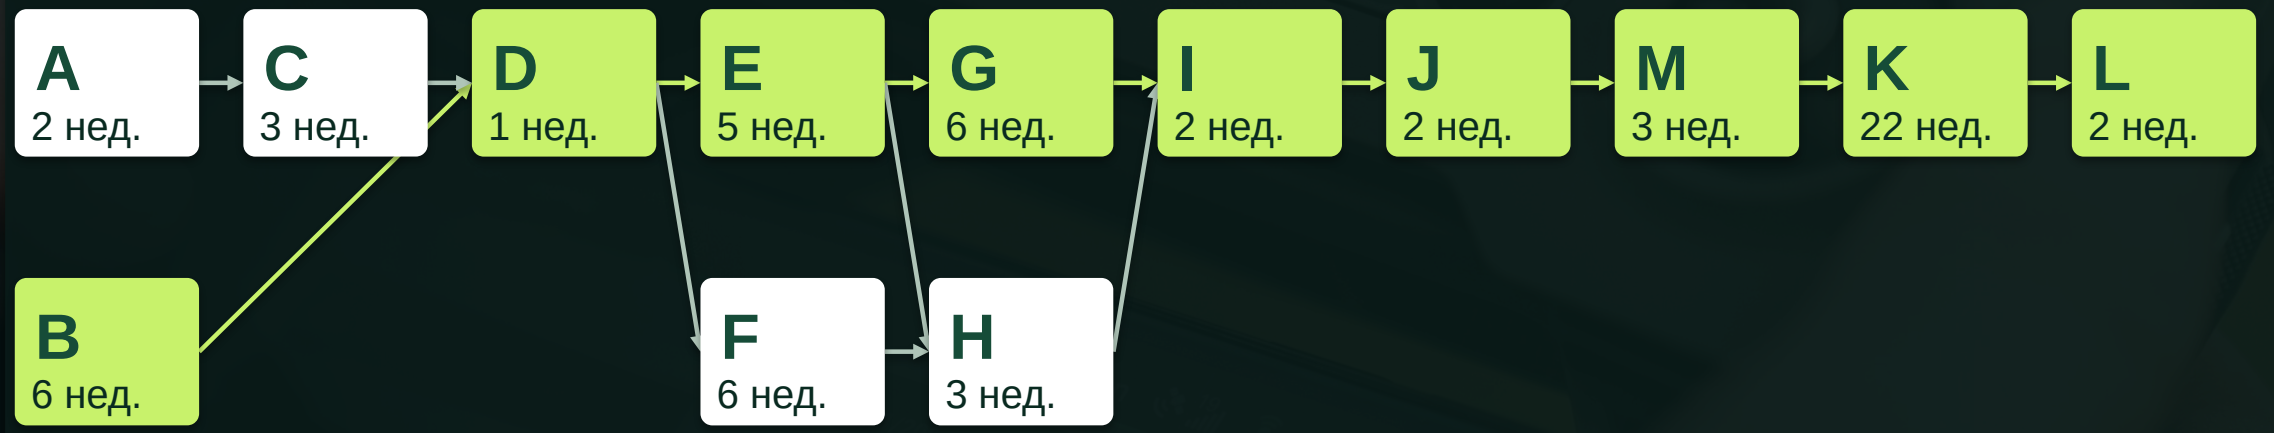

Критический путь: B → D → E → G → I → J → M → K → L

План, не выполненные этапы. Готовность и разрешения — обязательные условия.



У каждой работы — один принимающий результат

Работа	R	A	C	I
A Правовой gate	Юрист	Директор	Агроном, Опер. рук.	Инвестор
B Спрос / заявки	Продажи	Директор	Агроном	Инвестор
C ООО и договоры	Юрист	Директор	Бухгалтер	Инвестор
D Финансирование	Директор	Инвестор	Бухгалтер, Юрист	Команда
E Закупка	Опер. рук.	Директор	Агроном	Бухгалтер
F Обучение	Опер. рук.	Директор	Учеб. партнер, Агроном	Инвестор
G Готовность БВС	Юрист	Директор	Опер. рук.	Клиенты
H SOP / CRM	Агроном	Опер. рук.	Юрист	Продажи
I Испытания	Оператор	Опер. рук.	Агроном, Клиент	Директор
J Договоры сезона	Продажи	Директор	Агроном, Клиент	Бухгалтер
M Ожидание окна	Опер. рук.	Директор	Агроном, Клиент	Инвестор
K Сезон	Оператор	Опер. рук.	Агроном, Клиент	Директор
L Аналитика	Бухгалтер	Директор	Агроном, Опер. рук.	Инвестор


Выручка — еще не свободные деньги

[РАСЧЕТ, 2027] Выручка 8 800 000 ₽ · EBITDA 1 960 000 ₽

Чистая прибыль 32 000 ₽ · FCF 1 432 000 ₽

[ДОПУЩЕНИЕ] УСН 6%; налоговые параметры требуют новой сверки.

МЛН РУБ. / ВЫРУЧКА БЕЗ НДС

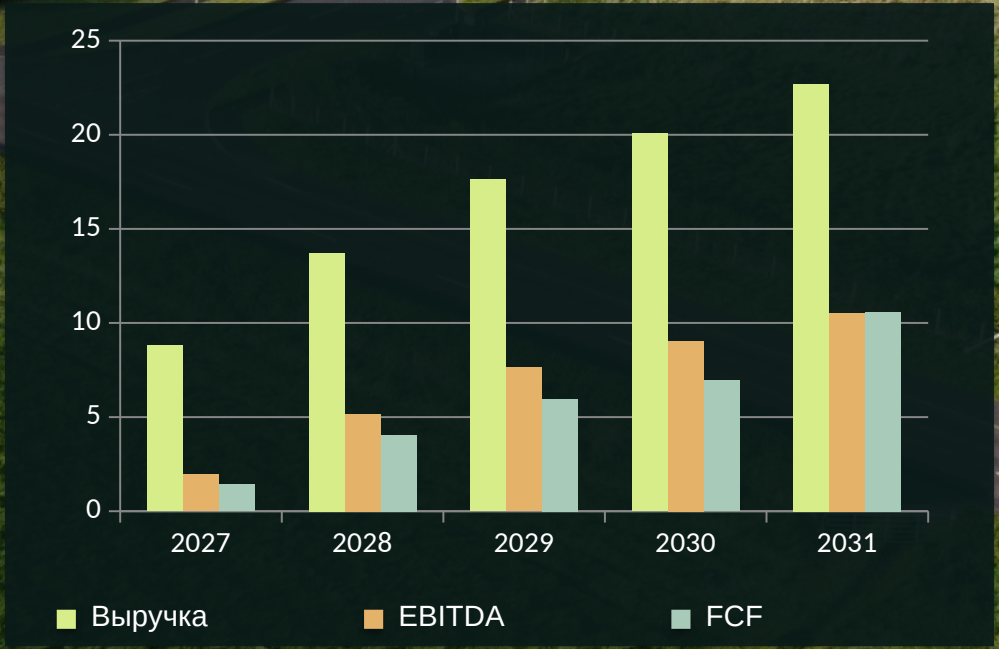




Положительная NPV чувствительна к цене и загрузке

[РАСЧЕТ] NPV 3 946 443,10 ₽ · 24% · 5 лет

Окупаемость: 2,676 / 3,885 года

Тарифы −10%: NPV 44 872,94 ₽; объемы −25%: −2 638 836,29 ₽.

МЛН РУБ. / NPV; СТАВКА 24%

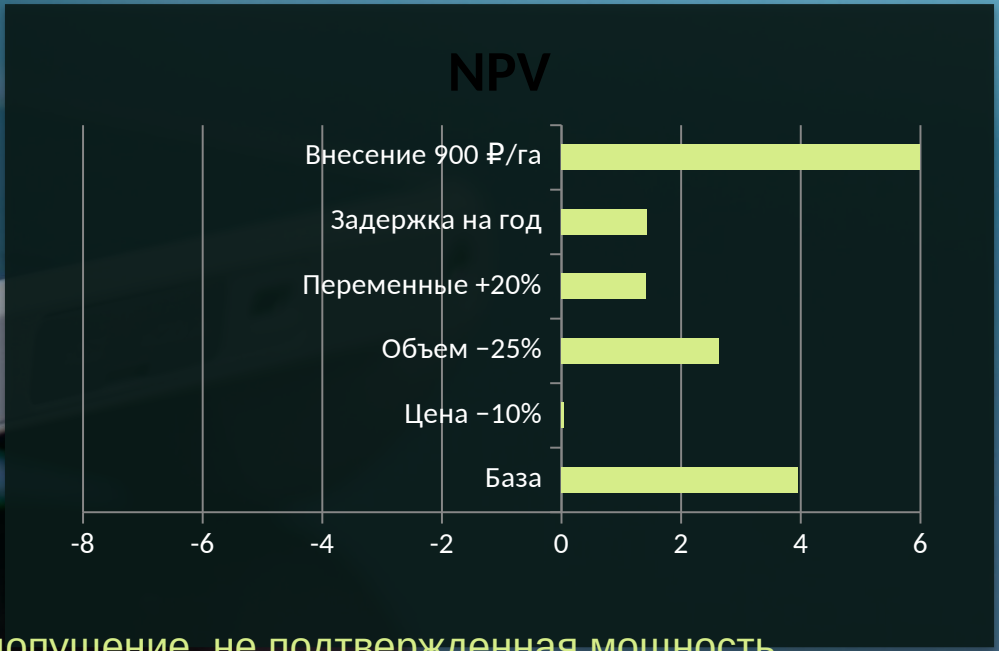

Ресурсный стресс: 20 полевых дней/месяц → NPV 2,310 млн ₽. Это допущение, не подтвержденная мощность.

9,5 млн ₽ — базовый бюджет, не подтвержденная закупка

[ДОПУЩЕНИЕ / РАСЧЕТ] CAPEX 7,0 + запуск 0,5 + резерв 2,0 млн ₽

Пара XAG P100 Pro: публичный ориентир 5,98 млн ₽ вместо 4,0

Закупочный стресс: финансирование 11,48 млн ₽; нужны полные КП.

СТАРТОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ: 9,5 МЛН РУБ.



Суммы вкладов не определяют доли в капитале

[ДОПУЩЕНИЕ] Учредитель 2,5 + инвестор 7,0 = 9,5 млн ₽

При закупочном стрессе внешний вклад 8,98 млн ₽

Деньги не подтверждены; доля инвестора не установлена; долг и гранты исключены.

ПРОЕКТНЫЕ СУММЫ, НЕ ДОЛИ В КАПИТАЛЕ





Показатели подтверждают акты, не презентация

[РАСЧЕТ, 2027] Выручка 8,8 млн ₽ · EBITDA-маржа 22,3% · FCF 1,432 млн ₽

[ДОПУЩЕНИЕ] Отчет ≤48 часов; 100% чек-листов; повторные договоры ≥60%

Цели не достигнуты; поздняя мощность ресурсно не подтверждена.



Финансировать поэтапно. Остановиться, если нет готовности.

[ДОПУЩЕНИЕ] Право на работы · спрос по полям · КП и кадры · кассовый план

Нет готовности → отложить капиталоемкий запуск

Мониторинг-only требует отдельной модели; масштабирование — после фактического сезона.
