АгроВектор

Мониторинг посевов.

Точечное внесение. Проверяемый отчет.


Татарстан / План 2027–2031



9,5 млн ₽ — стартовая потребность

Заказы, разрешения и деньги не подтверждены.

Сначала доказательства — затем сезон



[ДОПУЩЕНИЕ] Правовая карта: 01.11.2026

20 интервью: 29.11.2026 · 10 клиентов: 21.03.2027

Пилот 100 га: до 30.04.2027, внутри сезонного объема.

Клиент покупает результат, не дрон

[ДОПУЩЕНИЕ] Задание → обследование → внесение → отчет

Отчет до 48 часов · маршрут от 100 га-проходов

Мониторинг оплачивается отдельно; урожайность не гарантируется.



Бизнес-модель: девять проверяемых гипотез

2. Проблемы

Агроокна; неоднородность посевов; нехватка карт.

Альтернативы: наземная техника, свой БВС, подрядчик.

4. Решение

Обследование → карта → внесение → отчет.

Платный пилот и приемка.

8. Ключевые метрики

Оплаченные га; вклад; повторы; отчет ≤48 ч.

Цель:10 клиентов.

3. Уникальная ценность

От карты проблемы до согласованной операции и проверяемого отчета.

Гипотеза ценности, не обещание урожайности.

9. Преимущество

Пока НЕ подтверждено.

Будущий актив: карты и повторные договоры.

5. Каналы

Прямые продажи; агрономы; рекомендации; демонстрации.

1. Сегменты клиентов

КФХ и малые/средние хозяйства Татарстана.

Покупатель — директор; приемка — агроном.

Ранние: готовые оплатить конкретный пилот.

7. Структура затрат

Штат + взносы: 4,687 млн ₽.

Прочий OPEX; CAPEX и резерв отдельно.

6. Потоки доходов

Внесение: 6 000 × 1 300 = 7,8 млн ₽.

Мониторинг: 4 000 × 250 = 1,0 млн ₽. Всего 8,8 млн ₽.

TAM — вся Россия; SAM — доступный кластер; SOM — наш план

TAM / вся Россия	SAM / кластер Татарстана	SOM / план AgroVector
24.682 млрд ₽/год	124,5 млн ₽/год	8,8 млн ₽/год
79,298 млн га × 15% × (1,5 × 1 300 + 0,5 × 250).	200 хозяйств × 2 000 га × 15% × (1,5 × 1 300 + 0,5 × 250).	6 000 га-проходов × 1 300 + 4 000 га-обследований × 250.
Все категории хозяйств; потенциальные услуги, не продажи.	Радиус до 150 км; адресный реестр не подтвержден.	Цель 10 клиентов, не подписанные заказы.

Площадь РФ — статистическая база по вторичной публикации[33]. 15% пригодности, кратность и тарифы — допущения. SAM/SOM сценарные; SOM/SAM = 7.07% — не фактическая доля.

Публичные ориентировочные цены — не сопоставимые КП

Компания / регион	Операция / цена	Что входит и ограничения
Агродроны ЮФО / юг РФ	Обработка от 900 ₽/га	Заявление компании[36]. НДС, вода и логистика не уточнены; Татарстан не подтвержден.
ООО «Купец» / авторский материал	Ориентир 1 200–1 500 ₽/га с НДС	Публикация 07.05.2025[37], не прайс и не КП; состав и текущая цена требуют уточнения.
Агропрофи/XAG; Аграс; BeeUAV	Публичный тариф услуги не раскрыт	Запрашивать КП на одинаковое поле. Стоимость техники не является тарифом обработки.

AgroVector: план 1 300 ₽/га-проход и 250 ₽/га-обследование; препараты клиента.

Доли конкурентов публично не раскрыты. Полное нейтральное сравнение, URL и даты — в заметках.

Факторы среды → четыре стратегии действий

Внутренние / внешние	O — возможности Локальные сложные поля; платные пилоты с агрономами; подготовка кадров	T — угрозы Ограничения работ; погода и отказы; цена и задержки платежей
S — проектные сильные стороны Контур «карта–операция–отчет»; резервный БВС; короткие решения	SO: S1 + O1/O2 Платный пилот с паспортом поля и критериями приемки. Директор + агроном; до закупки.	ST: S2/S3 + T1/T2 Допуск, резерв, чек-лист; no-go без оснований. Опер. руководитель; каждый выезд.
W — слабые стороны Нет заказов и сезона; одна бригада; парк/кадры не подтверждены	WO: W1/W3 + O2/O3 КП, договорный портфель, предложения кандидатам и наставник. Директор; до финансирования.	WT: W2 + T2/T3 Лимит месячной загрузки, аванс и переносы; отказ от перегруза. Директор; перед договором.

Гипотезы раннего проекта. Полный перечень S1–T3, метрики и ответственные — в заметках и письменном плане.

Сила давления, объяснение и направление работ

Параметр	Уровень	Описание	Направление работ
Заменители	Высокий	Наземная техника, свой БВС, отказ от операции	Сравнить полную стоимость и применимость на конкретном поле; не обещать превосходство повсеместно
Действующие конкуренты	Высокий	Клиент сравнивает тариф, состав работ и доступное окно	Собирать сопоставимые КП; фиксировать приемку и отчетность
Новые участники	Средний	Технику можно купить, но капитал, персонал и допуски ограничивают вход	Удерживать клиентов качеством и повторными договорами; мониторить новых исполнителей
Покупатели	Высокий	Сезонный торг, концентрация портфеля, отсрочки	Лимиты концентрации и дебиторки; согласованный аванс и календарь
Поставщики	Средний–высокий	АКБ, комплектующие, сервис и совместимость зависят от поставщика	Два КП, запас критичных деталей, сервисный SLA; резерв не устраняет общий отказ

Нет основания для работ — нет вылета

[ДОПУЩЕНИЕ] ООО; правовая проверка конкретного поля, БВС и операции

150 км — логистика, не разрешенная зона

Разрешения и участие в ЭПР не подтверждены.

Власть × интерес определяют стратегию взаимодействия

ВЛАСТЬ

Высокая власть / низкий интерес

Регуляторы, страховщик: поддерживать удовлетворенность.

Юрист/директор — до допуска и при изменениях.

Высокая власть / высокий интерес

Учредитель, инвестор, ключевые клиенты: тесное управление.

Директор — еженедельно и перед решениями.

Низкая власть / низкий интерес

Не вовлеченные хозяйства вне маршрута, широкая аудитория: наблюдать.

Директор — ежемесячно.

Низкая власть / высокий интерес

Операторы, агроном, кандидаты, соседи/пчеловоды: информировать.

Опер. руководитель — до выезда; уведомления по закону.

ИНТЕРЕС →



Одна бригада. Последовательные операции.

[ДОПУЩЕНИЕ] 2 оператора · основной, резервный и мониторинговый БВС

[РАСЧЕТ] 2027: 54,15 полевых дня · одна бригада

20 эффективных дней — ресурсный экран; 16 — жесткий стресс. Не замер.

ПЛАНОВЫЕ ПОЛЕВЫЕ ДНИ; МОЩНОСТЬ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА



Три штатные единицы: gross и взносы раздельно

Роль	FTE	Gross / мес.	Gross / год	Взносы / год	Работодатель / год
Директор / продажи	1	100 000	1 200 000	362 400	1 562 400
Операторы	2	100 000 / чел.	2 400 000	724 800	3 124 800
ИТОГО	3	300 000	3 600 000	1 087 200	4 687 200

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР

98 479 ₽/мес., январь–июнь 2026.

СМИ со ссылкой на Татарстанстат[34].

План 2027: 100 000 ₽ gross каждому; не средняя по профессии.

РАСЧЕТ И ОГРАНИЧЕНИЯ

30% общие взносы + 0,2% травматизм (допущение).

НДФЛ внутри gross. Агроном, юрист и бухгалтер — отдельно в OPEX.

Оклады — план найма, не подтвержденные предложения кандидатам. Региональная средняя не равна зарплате пилота.

От запуска сервиса к проверяемым результатам

0. Запуск AgroVector

1. Проверка

- A Правовой маршрут
- B Интервью и заявки
- C ООО и договоры

2. Ресурсы

- D Решение / транши
- E Приемка техники
- F Подготовка команды
- G Документы / no-go

3. Готовность

- H SOP / карты / CRM
- I Стендовая приемка
- J Договоры / маршруты
- M Предсезонный допуск


4. Сезон / аудит

- K Пилот + сезон
- L Аудит / продление

Все 13 пакетов из project_plan.csv. Это дерево декомпозиции, не календарь: зависимости — на слайде 15.




Календарь запуска зависит от готовности

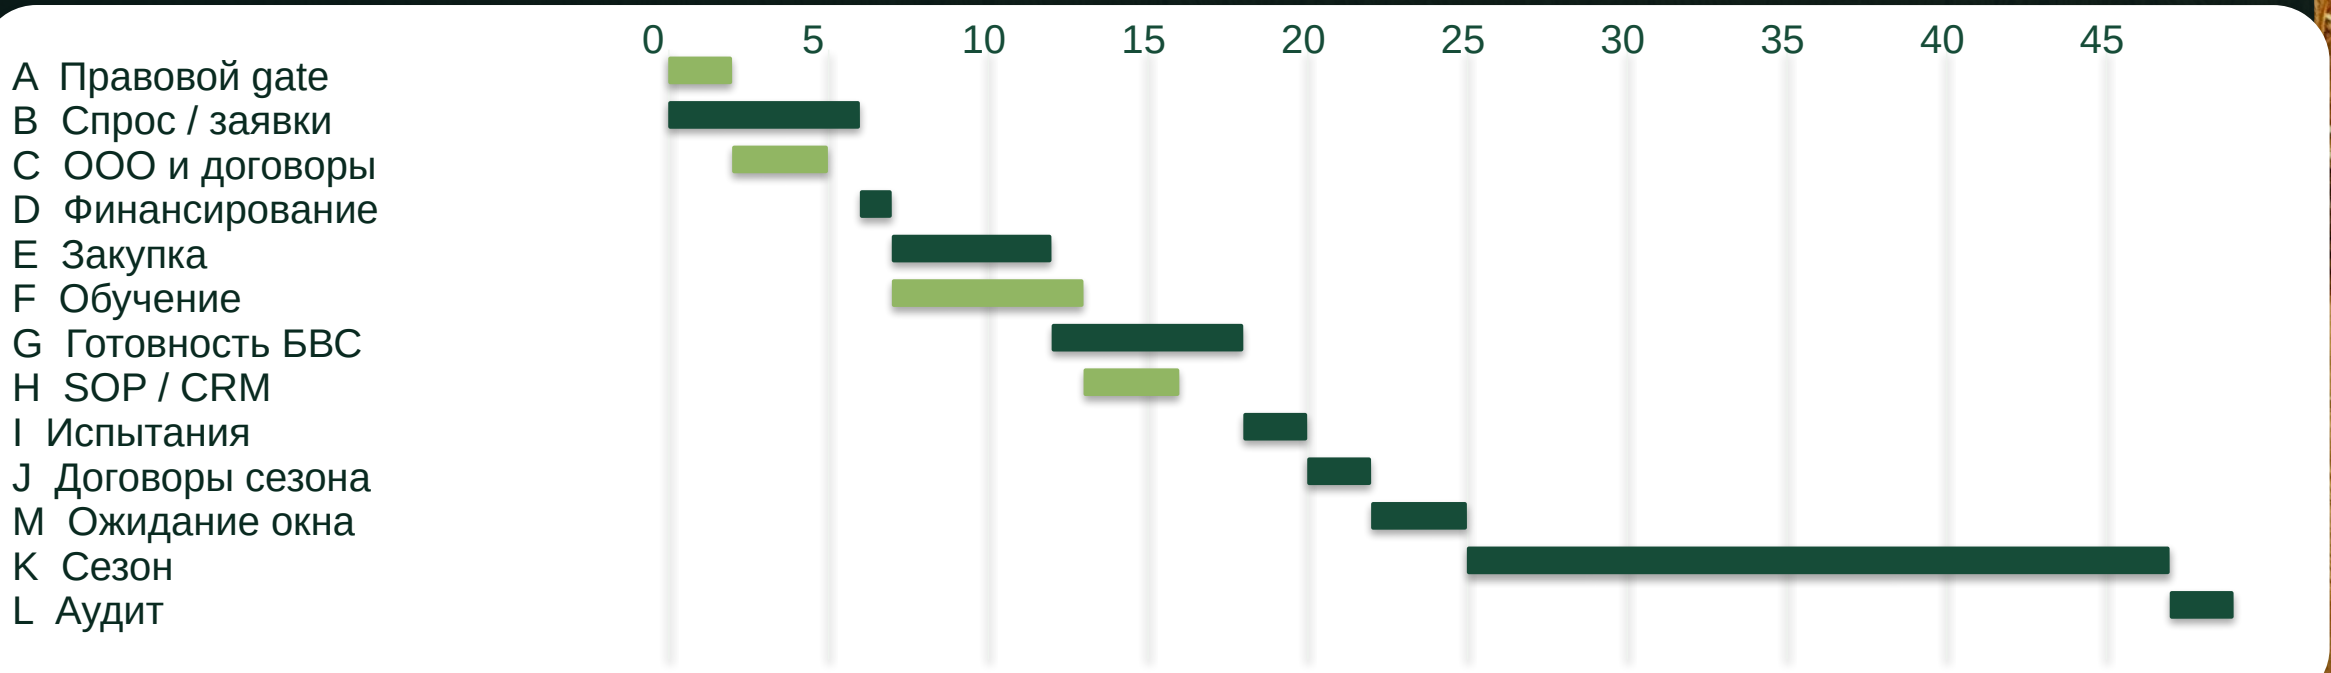

План, не выполненные этапы. Готовность и разрешения — обязательные условия.

Критический путь нельзя обойти закупкой

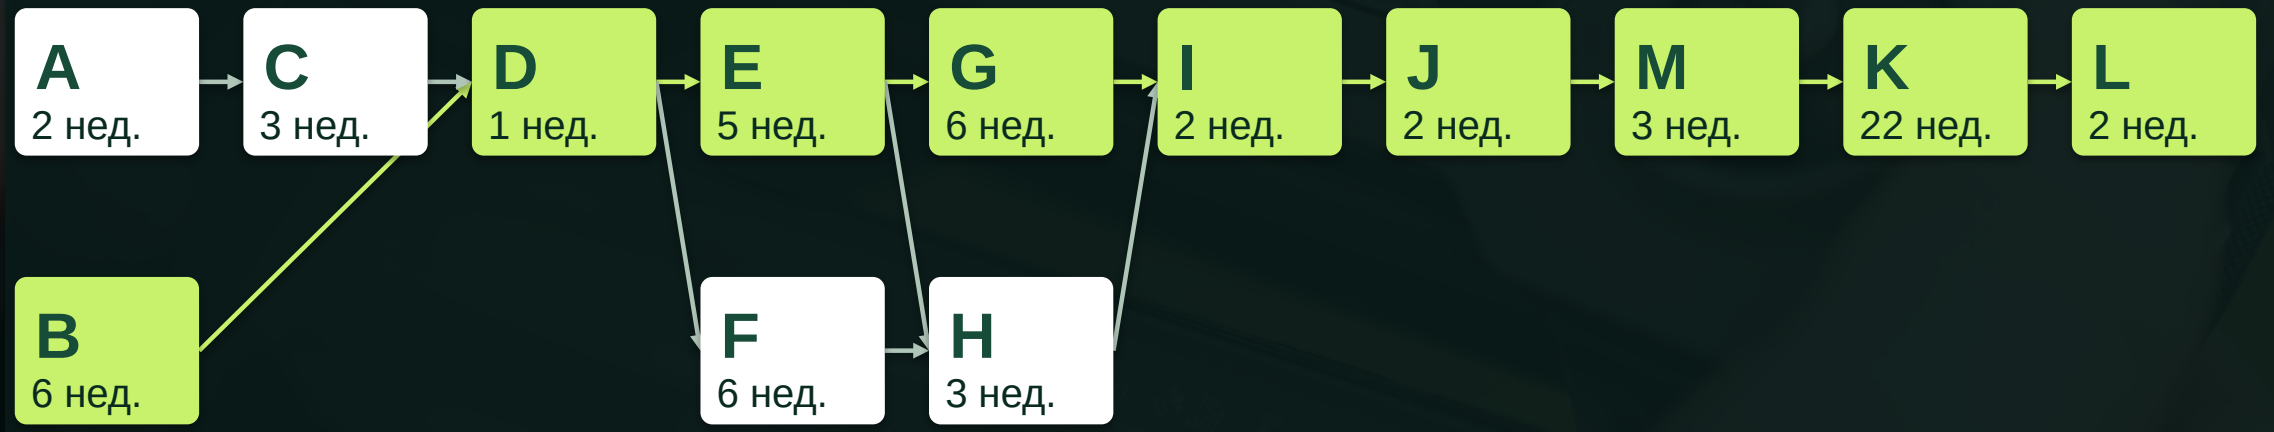

Критический путь: B → D → E → G → I → J → M → K → L

План, не выполненные этапы. Готовность и разрешения — обязательные условия.

Кто выполняет, утверждает, консультирует и получает информацию

Работа	Директор	Инвестор	Юрист	Бухгалтер	Агроном	Опер. рук.	Оператор 2	Учебный партнер	Клиент
A Правовой маршрут	A	I	R	—	C	C	—	—	—
B Интервью и заявки	R/A	I	—	—	C	—	—	—	—
C ООО и договоры	A	I	R	C	—	—	—	—	—
D Решение / транши	R	A	C	C	—	I	I	—	—
E Приемка техники	A	—	—	I	C	R	—	—	—
F Подготовка команды	A	I	—	—	C	R	—	C	—
G Документы / no-go	A	—	R	—	—	C	—	—	I
H SOP / карты / CRM	I	—	C	—	R	A	—	—	—
I Стендовая приемка	I	—	—	—	C	A	R	—	C
J Договоры / маршруты	R/A	—	—	I	C	—	—	—	C
M Предсезонный допуск	A	I	—	—	C	R	—	—	C
K Пилот + сезон	I	—	—	—	C	A	R	—	C
L Аудит / продление	A	I	—	R	C	C	—	—	—

R — выполняет A — утверждает C — консультирует I — информируется — — не участвует

Опер. рук. = первый оператор. Оператор 2 = второй сотрудник; в I/K выполнение и утверждение разделены.

База: прежние тарифы; новые стресс-сценарии не меняют base NPV

2027 / МЛН РУБ.

Выручка: 8,800

Переменные: 2,640


Фикс. OPEX: 5,887

EBITDA: 0,273

FCF: -0,255

Фикс. расход: 490 600 ₽/мес.

Без выручки: минус с 5-го мес.[1]

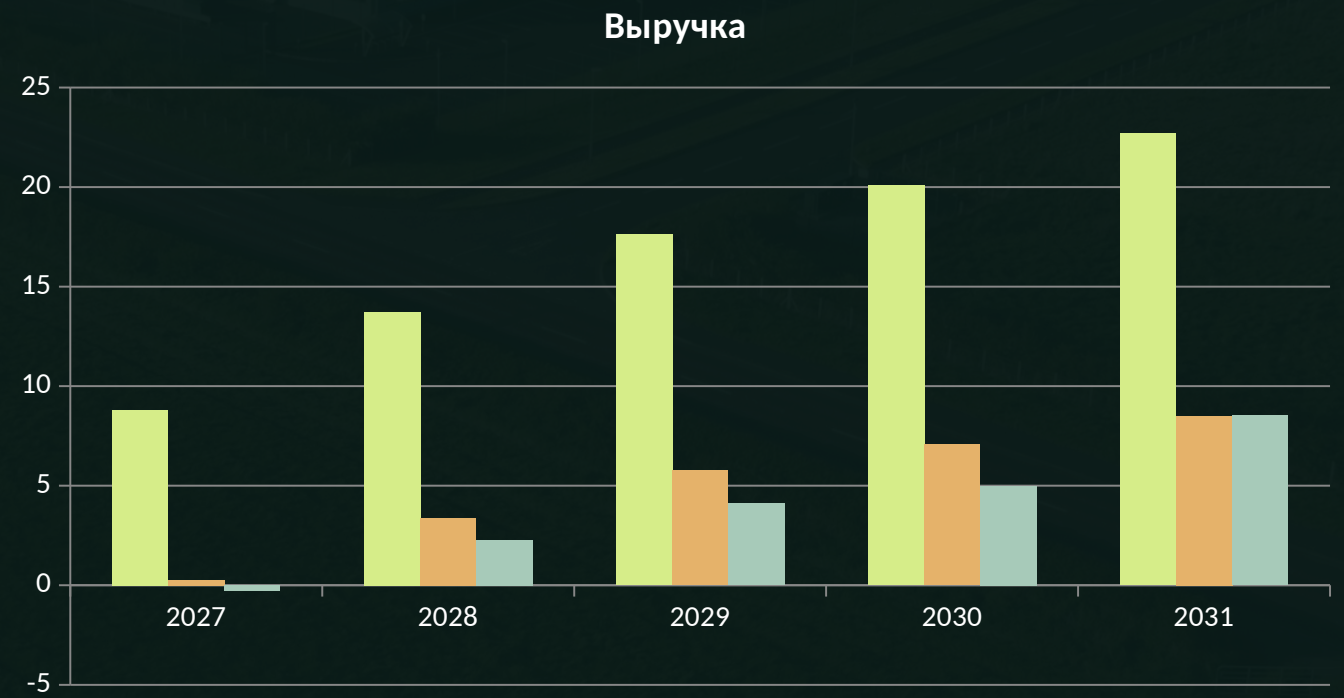

Выручка / EBITDA / FCF; [1] стресс без выручки, резерв 2 млн ₽.

Базовый NPV сохранен; устойчивость зависит от ресурса одной бригады

СТАВКА 24% / 5 ЛЕТ

NPV базы: −1,068 млн ₽

Окупаемость: 3,68 года;

дисконтир.: не достигнута


за 5 лет.

Цена внесения: 1 450 ₽/га-проход

20 дней: NPV +1,007 млн ₽

16 дней: NPV −1,516 млн ₽

Это сценарии, не новая база.

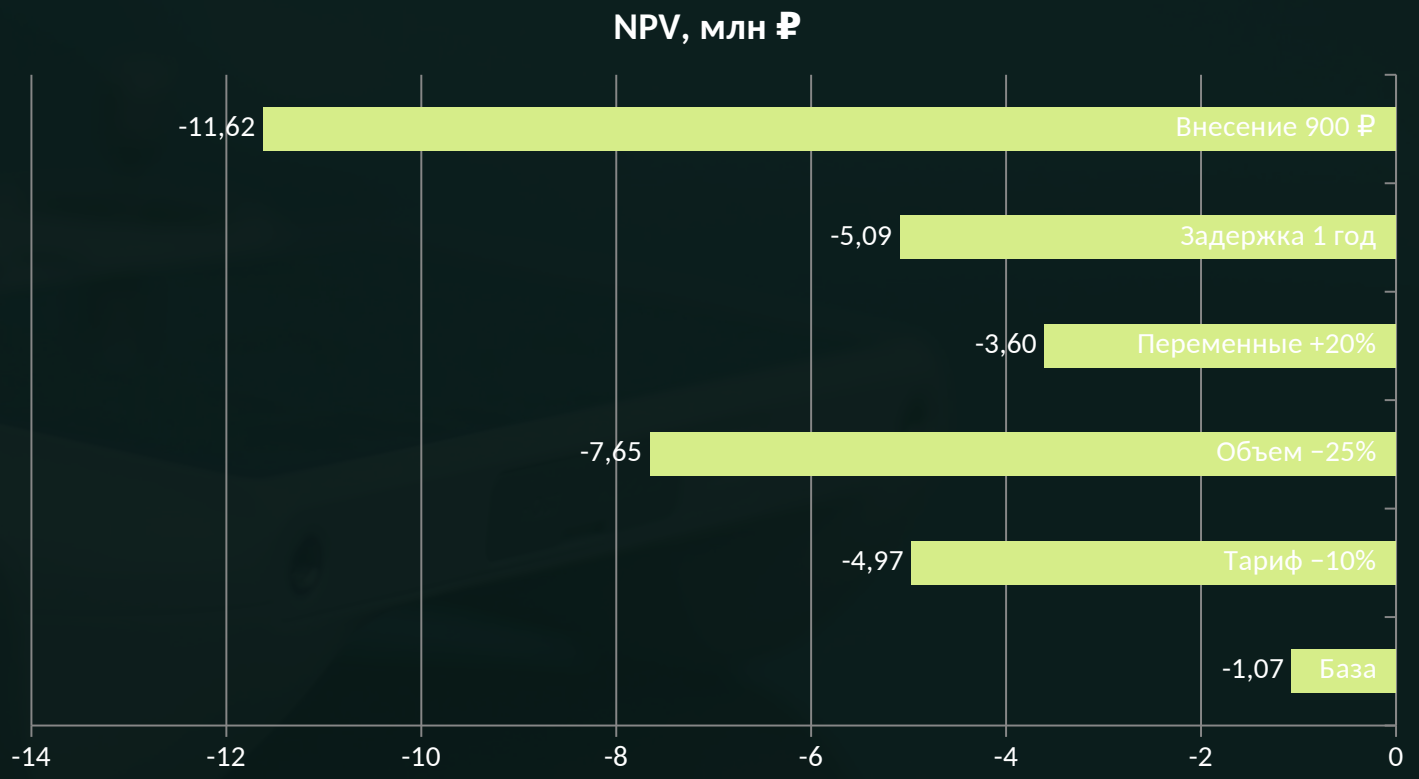



9,5 млн ₽ — базовый бюджет, не подтвержденная закупка

[ДОПУЩЕНИЕ / РАСЧЕТ] CAPEX 7,0 + запуск 0,5 + резерв 2,0 млн ₽

Пара XAG P100 Pro: публичный ориентир 5,98 млн ₽ вместо 4,0

Кассовый стресс: лаг 1 мес. −417 800 ₽; 2 мес. −1 568 400 ₽.



Суммы вкладов не определяют доли в капитале

[ДОПУЩЕНИЕ] Учредитель 2,5 + инвестор 7,0 = 9,5 млн ₽

При закупочном стрессе внешний вклад 8,98 млн ₽

Лаг 1 мес. + аванс 30%: минимум лишь 21 760 ₽; буфера нет.



Финансы и мощность: расчет не равен подтвержденной готовности

Показатель	2027	2031
Выручка, млн ₽	8,800	22,695
EBITDA, млн ₽	0,273	8,489
FCF, млн ₽	-0,255	8,528
Внесение / мониторинг	6000 / 4000	13000 / 10000
Бригады / FTE	1 / 3	1 / 3

Поздние объемы ресурсно не подтверждены. FCF 2031 включает возврат резерва 2 млн ₽ только в конце горизонта.



Проверки — GO.
Закупка — после gates.

Проверить: допуск, спрос, КП и команду, мощность и кассу.

Внешние проверки открыты. До их закрытия — NO-GO на закупку.

Мониторинг-only требует отдельной модели; масштабирование — после фактического сезона.
